



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā,
Liepājā"

Nr. 22-02-FL03-F043.0207-000004

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2023. gada 16. oktobrī

2023. gada 16. oktobrī Liepājas pilsētas būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas īstenotā projekta "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" ietvaros izbūvēto rotaļu laukumu.

Uzņēmums SIA "Fixman ir izbūvējis vizuāli pievilcīgu un augstas kvalitātes rotaļu laukumu, kas atbilst starptautiskajiem un Latvijas valsts standartiem par drošību un veselību. Jaunais rotaļu laukums veidots atbilstoši vienotai Jūrmalas parka rotaļu laukumu tematikai "Jūra", tādējādi papildinot un attīstot tajā esošo risinājumu koncepciju.

Laukumā ~ 436 m² platībā ir izvietotas 11 rotaļu iekārtas, no kurām centrālais objekts ir daudzfunkcionāls rotaļu komplekss "Bāka", kas satur gan torni, no kura aplūkot apkārtni, gan dažāda veida un dažādos augstumos izvietotus slidkalniņus, kāpelēšanas elementus, horizontālas un vertikālas tīklu sistēmas, alpīnisma sienu, kā arī citus papildu elementus. Rotaļu laukuma daudzpusīgākai izmantošanai uzstādītas arī dažāda veida šūpoles, 3D astoņkājis, karuselis, pusbumba, batuti un interaktīva rotaļu iekārta – mūzikas/stāstu bumba. Laukuma segums veidots, izmantojot drošu un kritienus absorbējošu gumijas plātņu mākslīgo segumu, kura dizains veidots kā "ūdens", "krasta" un "zaļā" zona, savukārt, batutu paaugstinājuma zonā ieklāts lietās gumijas segums. Papildus aktivitāšu rosināšanai segumā iestrādāta spēle "Klasītes".

Īstenojot projektu, ir paplašināta ģimeņu aktīvās atpūtas iespēju daudzveidība gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem, radot infrastruktūru, kas pieejams interesentiem bez ierobežojumiem – bez maksas un jebkurā laikā.

Projekts realizēts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. EJZF administrējošās iestādes – Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Projekta kopējās izmaksas ir 178 012,28 EUR, no kurām:
EJZF finansējums 157 319,10 EUR;
Liepājas valstspilsētas pašvaldības finansējums 20 693,18 EUR.



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija ievietota 2023. gada 7.septembrī


Liepājas Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā turpinās jaunā rotaļu laukuma izbūves darbi. Iestājoties meteoroloģiski atbilstoši laikapstākļiem, rotaļu laukumā būvnieks SIA "Fixman" ir atsācis rotaļu laukuma izbūves darbus. Lai arī joprojām ir augsts gruntsūdens līmenis, ūdens tiek atsūkņēts, lai varētu veikt nepieciešamos darbus. Tiek turpināta laukuma pamatnes izbūve, kā arī rotaļu iekārtu montāžas darbi. Nu jau rotaļu laukums sāk iegūt savas aprises – tiek montēts galvenais laukuma elements rotaļu komplekss "Bāka", kā arī tiek uzstādītas citas rotaļu laukuma konstrukcijas.



1.attēls. Būvlaukums 2023. gada 6. septembrī.

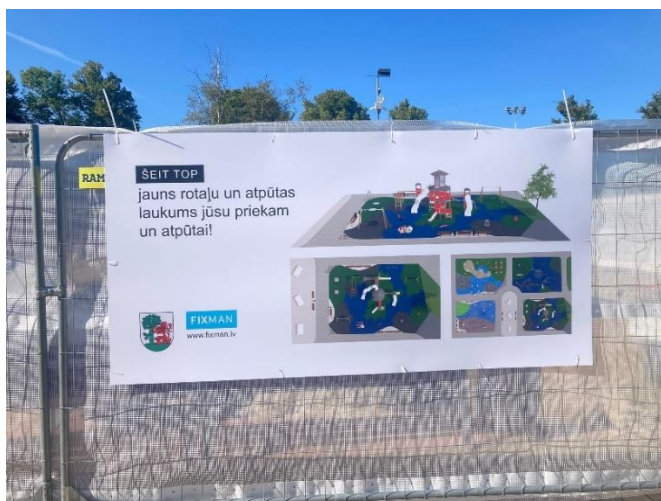

2.attēls. Informatīva plāksne.

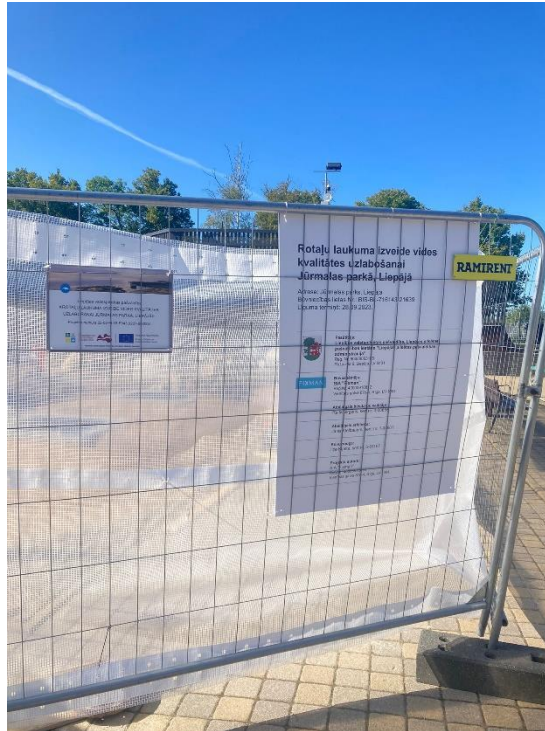

3.attēls. Būvtafele un projekta informatīvā plāksne.



LIEPĀJAS
RAJONA
PARTNERĪBA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija ievietota 2023. gada 21. augustā

2023. gada jūlija beigās tika uzsākti rotaļu laukuma izbūves darbi – būvnieks SIA “Fixman” veica atsevišķu rotaļu laukuma konstrukciju piegādi un montāžu objektā, kā arī uzsāka laukuma pamatnes sagatavošanas darbus.

Ņemot vērā intensīvos nokrišņus augusta sākumā, kā rezultātā būvlaukuma teritorija applūda, būvnieks nespēja veikt laukuma ierakumu sagatavošanu. Lai arī tika veikti plūdu seku novēršanas darbi (ūdens sūkņēšana), būvniecības procesam atbilstošs rezultāts netika sasniegts – dēļ pārmitrinātās grunts nebija iespējams izbūvēt konstruktīvās kārtas ar nepieciešamo sablīvējumu un nestspēju. Turpinoties intensīvajām lietusgāzēm, būvnieks informēja pašvaldību, ka augsto gruntsūdeņu dēļ nav iespējams kvalitatīvi veikt darbus, līdz ar to darbi tiek apturēti, darbu atsākšanu prognozējot pie meteoroloģiski atbilstošiem laikapstākļiem.

Pašvaldība, balstoties uz izveidojušos situāciju un apzinoties riskus neiekļauties noteiktajā projekta īstenošanas gala termiņā, lūdza Lauku atbalsta dienestam projekta termiņa pagarinājumu. 2023. gada 14. augustā tika saņemta Lauku atbalsta dienesta vēstule par termiņa pagarinājuma apstiprināšanu līdz **2023. gada 30. septembrim**.



1.attēls. Būvlaukums 2023. gada 1. augustā.



2.attēls. Būvlaukums 2023. gada 8. augustā



LIEPĀJAS
RAJONA
PARTNERĪBA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija ievietota 2023. gada 24. jūlijā

Rotaļu laukuma būvnieks SIA "Fixman", saņemot Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tuvākajā laikā uzsāks būvdarbus objektā Jūrmalas parkā, Liepājā. Darbu būvuzraudzību atbilstoši 2023.gada 22.jūnijā noslēgtajam līgumam Nr. 113/2.8.7 veiks Ilze Ķipste.

Jau pavisam drīz tiks izbūvēts jauns un daudzfunkcionāls rotaļu laukums, kas iekļausies un papildinās apkārtējā vidē esošo laukumu koncepciju atbilstoši vienotai tematikai "Jūra".

Projekta kopējās izmaksas, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, ir 174 799,00 euro, no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 157 319,10 euro, bet pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 17 479,90 euro.



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija ievietota 2023. gada 5. jūnijā

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2023. gada 31. maijā ir noslēgusi līgumu ar iepirkuma Nr. LVP 2023/46 rezultātā izvēlēto būvnieku un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāju SIA "Fixman" par rotaļu laukuma izveidi par kopējo līguma cenu 141 900,00 euro bez PVN. Tiklīdz tiks izstrādāta un saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija – paskaidrojuma raksts, uzņēmums varēs veikt būvdarbus rotaļu laukuma izbūvei Jūrmalas parkā, Liepājā.

Lai nodrošinātu rotaļu laukuma būvdarbu būvuzraudzību, ir pieņemts lēmums iepirkumā Nr. LVP 2023/47 "Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā"" par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu sertificētam ceļu būvdarbu būvuzraugam – Ilzei Ķipstei par kopējo līguma cenu 3 100,00 euro bez PVN. Tuvākajā laikā ar uzvarējušo pretendentu tiks noslēgts līgums, lai būvuzraugs, tiklīdz būvdarbi rotaļu laukumā tiks uzsākti, varētu veikt būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši līguma nosacījumiem.



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija ievietota 2023. gada 29. martā

Iepirkumu procedūra ar identifikācijas Nr. LVP 2022/185 "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" tika izbeigta 2023. gada 1. martā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 229. punktā noteikto. Lai gan atklātajā konkursā tika iesniegti 6 pretendentu piedāvājumi, konkurss tika izbeigts, jo tika iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.

Neatkāpjoties no veiksmīgas projekta ieviešanas un operatīvi reaģējot uz izveidojušos situāciju, tika pārskatītas iepirkuma priekšmeta prasības (neietekmējot projekta sasniedzamo mērķi un rezultātus) un 2023. gada 10. martā tika izsludināta atkārtota iepirkumu procedūra Nr. LVP 2023/46, kurā paredzēts noskaidrot bērnu rotaļu laukuma izbūves tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksta) sagatavotāju un būvdarbu veicēju. Plānotais piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.04.2023.

Savukārt, 2023. gada 9. martā tika izsludināta iepirkumu procedūra Nr. LVP 2023/47 "Būvuzraudzības pakalpojumi objektam "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā"", kurai piedāvājumu iesniegšanas termiņš arī paredzēts 11.04.2023. Projekta īstenošanas gala termiņš netiek mainīts, kas ir 2023. gada 31. augusts.



NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija ievietota 2022. gada 14. decembrī

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija 2022. gada 22.septembrī saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta "Rotaļu laukuma izveide vides kvalitātes uzlabošanai Jūrmalas parkā, Liepājā" Nr. 22-02-FL03-F043.0207-000004 apstiprināšanu un publiskā līdzfinansējuma piešķiršanu.

Projekta īstenošanai pašvaldības iepirkumu daļa izsludinājusi atklātu konkursu Nr. LVP 2022/185, kurā paredzēts noskaidrot bērnu rotaļu laukuma izbūves tehniskās dokumentācijas (paskaidrojuma raksta) sagatavotāju un būvdarbu veicēju. Plānotais piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.01.2023. Tuvākajā laikā tiks sagatavota iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums arī projekta būvuzraudzībai.

Realizējot projektu, Liepājas Jūrmalas parkā tiks izveidots jauns un vizuāli pievilcīgs, augstas kvalitātes un drošs bērnu rotaļu laukums ar tematisko virzienu "Jūra", kas paplašinās bērnu un jauniešu rotaļāšanās iespējas, uzlabos laukuma telpisko kompozīciju, kā arī pateicoties rotaļu laukumam tiks mazināta parka antropogēnā slodze uz piejūras un iekšzemes biotopiem.
