



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” (identifikācijas Nr.5.5.1.0/20/I/003)

AKTUALITĀTES

Informācija ievietota 2023. gada 30. augustā

2023. gada aprīlī trešo reizi atkārtoti tika izsludināts konkurss par informācijas standu izgatavošanu un uzstādīšanu Liepājas vēsturiskā centra pludmales zonā (ID Nr. LVP 2023/59).

2023. gada 3. maijā Iepirkuma komisija, konstatējot, ka noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens piedāvājums, pieņēma lēmumu iepirkuma procedūru izbeigt bez rezultāta. Tā kā objektā būvdarbi tika pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā jau 2022. gadā, izslēdzot informatīvo standu uzstādīšanu no būvdarbu līguma, tad pēc trīs neveismīgām iepirkuma procedūrām pieņemts lēmums, izslēgt projekta darbību 1.5. no projekta. Projekta darbība 1.5. paredzēja Informācijas standu un virziena norāžu izveidi Liepājas vēsturiskā centra pludmales zonas labiekārtojumā.

Vienošanās Nr.5.5.1.0/20/I/003 Grozījumi Nr.4 noslēgti starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” 2023. gada 21. augustā.

Projekta “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstība un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” kopējie izdevumi: 1 743 522 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi 1 313 890 EUR, no kuriem 85% ERAF finansējums, 3,75% valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% Pašvaldības finansējums. Projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 429 632 EUR, kuras tiek segtas no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Projekta ietvaros ir veikta:

- gājēju piekļuves infrastruktūras pārbūve un izveide (koka seguma laipu un liedaga koka seguma platformu izveide);
- sanitārtehniskā aprīkojuma – stacionāro publisko tualetu, dušu un dzeramā ūdens punktu izveide;
- solu, sadzīves atkritumu urnu, velo statīvu, ģērbtuvju izveide;
- kāpu eroziju mazinošo risinājumu – nožogojumu, palisāžu izveide;
- dekoratīvo apstādījumu izveide;
- vides objektu “Kaija” un “Vilnis” izveide un uzstādīšana;
- funkcionālā un dekoratīvā apgaismojuma izbūve;
- ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes izbūve un pārbūve.

Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši.



Informācija ievietota 2023. gada 9. martā

2022.gada decembra vidū atkārtoti tika izsludināts atkārtots konkurss par informācijas stendu izgatavošanu un uzstādīšanu Liepājas vēsturiskā centra pludmales zonā (ID Nr. LVP 2022/209). Diemžēl arī tas janvāra beigās tika izbeigts, jo iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pēc atkārtotās neveiksmes Pašvaldība nolēma pārstrādāt un mainīt iepirkumā izvirzītās prasības, lai varētu tikt īstenota atlikusī projekta darbība un paredzētie informācijas stendi tiktu izgatavoti un uzstādīti Liepājas centra pludmalē. Jaunu iepirkumu plānots izsludināt aprīļa sākumā.

Papildus, apzinoties, ka projektu nav iespējams pabeigt noteiktajā termiņā, ir ierosināts vēl viens projekta termiņa pagarinājums (līdz 2023.gada 31.augustam), pamatojoties uz izbeigtajiem iepirkumiem.



Informācija ievietota 2022.gada 12.decembrī

Projekta ietvaros ir atlikusi informatīvo stendu un virziena norāžu izveide un uzstādīšana Liepājas vēsturiskā centra pludmales zonā. Lai to īstenotu oktobra beigās tika izsludināts atklāts konkurss (ID Nr. LVP 2022/176), kas tika izbeigts, jo iesniegtais piedāvājums neatbilda iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Pašvaldība precīzēs iepirkuma dokumentāciju un sludinās jaunu konkursu darbu veikšanai.

Papildus, lai īstenotu atlikušo darbību par informatīvo stendu un virziena norāžu izveidi un uzstādīšanu, ir pagarināts projekta kopējais īstenošanas termiņš līdz 2023.gada 28.februārim.



Informācija ievietota 2022. gada 9. septembrī

2022. gada 31. augustā objekts "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" pieņemts ekspluatācijā.

Projekta ietvaros pilnībā pārbūvētas trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu, pludmali un labiekārtota to pieguļošā teritorija un vienā izejā ir veikta tikai inženiertīklu (ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un elektroapgādes) izveide.

Uzlabojot centra pludmales pieejamību un atpūtas aprīkojumu, ir veikta:

- gājēju piekļuves infrastruktūras pārbūve un izveide (koka seguma laipu un liedaga koka seguma platformu izveide);
- sanitārtehniskā aprīkojuma - stacionāro publisko tualetu, dušu un dzeramā ūdens punktu, izveide;
- soli, sadzīves atkritumu urnu, velostatīvu, ģērbtuvju izveide;
- kāpu eroziju mazinošo risinājumu - nožogojumu, palisāžu, izveide;
- dekoratīvo apstādījumu izveide;
- vides objektu "Kaija" un "Vilnis" izveide un uzstādīšana;
- funkcionālā un dekoratīvā apgaismojuma izbūve;
- ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas, elektroapgādes izbūve un pārbūve.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2022.gada 7. jūnijā

No 2022.gada 11.aprīļa objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" pilnībā ir atsākti būvdarbi.

Līdz vasaras sākumam ir izbūvēts apgaismojums un uzstādīti gaismekļi visās pārbūvējamajās izejās uz pludmali. Pabeigta nepieciešamo inženiertīklu izbūve. Pilnībā pabeigti koka laipu un platformu izveides darbi izejās ap Glābšanas staciju, uzstādīts sanitārtehniskais aprīkojums (tualetes un dušas) un labiekārtojuma elementi (pārģērbšanās kabīnes, soli, atkritumu urnas, velostatīvi). Izbūvētas gan apaļkoka atbalstsienas kāpām, gan gājēju plūsmu norobežojošie elementi.

Gandrīz pabeigti darbi arī izejā aiz koncertdārza "Pūt, vējiņi!". Starp koncertdārzu un āra tenisa kortiem pabeigti seguma izbūves darbi, izbūvētas kāpnes un panduss. Segumā izvietotas tūrisma maršruta "Kā pa notīm" bruģī iestrādātās notis. Pabeigta krustpunkta ar veloceliņu pārbūve, izveidojot labiekārtotu apli. Pludmales daļā pabeigta koka laipas un platformas izbūve, uzstādīti labiekārtojuma elementi, daļēji uzstādīts sanitārtehniskais aprīkojums. Izbūvētas apaļkoka atbalstsienas.

Izejā pie Kūrmājas prospekta pabeigta krustpunkta ar veloceliņu pārbūve, izbūvējot labiekārtotu apli. Tā kā kavējas kokmateriālu piegāde, nedaudz kavējas koka laipu un platformu izbūves darbi.

Līdz maija vidum apstiprināti gandrīz 75% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp:

- 90% no ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas izbūves darbiem,
- 81% elektroapgādes izbūves darbiem,
- 95% apgaismojuma izbūves darbiem,
- 61% no teritorijas labiekārtojuma un seguma izbūves darbiem.



Informācija ievietota 2022. gada 7. martā

No 2022. gada 24. februāra objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” ir atsākti būvdarbi atsevišķiem darbu veidiem.

Tehnoloģiskais pārtraukums turpinās bruģakmens segumu izbūves darbiem (t.sk. segas konstrukcijas izbūves darbiem), jo vidējā gaisa temperatūra nav atbilstoša darbu veikšanai un pastiprinātais nokrišņu daudzums ir traucējošs, lai iestrādātu minerālmateriālus atbilstoši projekta prasībām.



Informācija ievietota 2021. gada 6. decembrī

Ņemot vērā vēja ietekmi pludmales zonā, kura rezultātā regulāri tiek appludināta pludmales zona, nav iespējams veikt darbus ar jaunajām platformām un koka laipām. Kā arī, patstāvīgo nokrišņu dēļ, nav iespējams sasniegt nepieciešamās projekta prasības uz minerālmateriālu sablīvējumu, jo esošā grunts un materiāli ir pārmitrināti, objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums visu darbu veikšanai no 2021.gada 3.decembra.

Būvdarbi tiks atsākti, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, indikatīvi 2022.gada marta beigās.



Informācija ievietota 2021. gada 29. oktobrī

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.5.1.0/20/I/003 “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” ietvaros noris projekta darbību īstenošana.

Būvdarbi tiek veikti pakāpeniski. Jūrmalas ielas izejā uz pludmali ir pabeigti visi šajā izejā plānotie darbi – pabeigta inženiertīklu izbūve. Noslēdzoties peldsezonai, būvdarbi noris visās pārbūvei paredzētajās izejās uz pludmali – gar Glābšanas staciju, virzienā no koncertdārza “Pūt, vējiņi!” un Kūrmājas prospekta izejā.

Kopš būvdarbu sākuma līdz oktobra beigām ir apstiprināti aptuveni 20% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 61% no ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas izbūves darbiem, 47% elektroapgādes, 57% apgaismojuma izbūves darbiem un 27% no teritorijas labiekārtojuma un segumu izbūves darbiem.

Lai gan kustību ierobežojumi būvdarbu zonā ir mazināti, iedzīvotāji joprojām tiek aicināti sekot līdzi norobežojumiem un ievērot, ka veloceliņa zona posmā no


Jūrmalas ielas līdz Kūrmājas prospektam ir būvobjekts, un iepļānot apkārceļu pa pludmali vai caur Jūrmalas parku.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2021. gada 28. jūlijā

Sāksies pludmales izejas pārbūve pie Kūrmājas prospekta

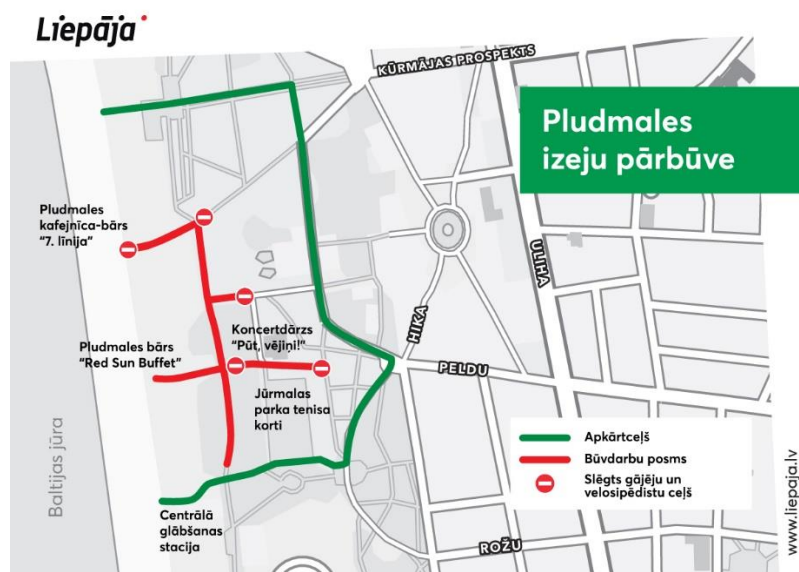

Turpinot Liepājas centrālās pludmales infrastruktūras izbūvi, nākamnedēļ plānots sākt būvdarbus pludmales izejā pie Kūrmājas prospekta, kas ved uz pludmales kafējnīcu "7. līnija". Līdz ar būvdarbiem jāērēķinās ar papildu kustības ierobežojumiem uz gājēju un velobraucēju ceļa.

Šonedēļ paredzēts pabeigt inženiertīklu izbūves darbus Jūrmalas ielas galā. Jau ir izbūvēts ūdensvads un kanalizācija, atlikusi seguma atjaunošana. Līdz ar šo darbu pabeigšanu, nākošnedēļ plānots sākt būvdarbus pludmales izejā pie Kūrmājas prospekta.

Saistībā ar būvdarbiem parka apmeklētājiem jāērēķinās ar papildu kustības ierobežojumiem gan uz gājēju un velobraucēju ceļa, gan pludmales izejās, sākot no Kūrmājas prospekta līdz centrālajai glābšanas stacijai. Šo posmu var apiet pa pludmali vai parka daļu.

Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā Liepājas centrālās pludmales infrastruktūras būvdarbi līdz gada beigām tiks pabeigti un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums.

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju pie Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!", kā arī izeju pie centrālās glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā izbūvēti inženiertīkli.

Būvdarbus veic SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošina SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "JOE".

Būvdarbi objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" tiek īstenoti ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2021. gada 13. jūlijā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.5.1.0/20/I/003 "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros noris projekta darbību īstenošana.

Būvdarbi tiek veikti pakāpeniski un izejā uz pludmali no koncertdārza "Pūt, vējiņi!" puses daļa būvdarbu ir pabeigta un ir atvērta kustībai uz pludmali. Uz laiku tika slēgta gājēju kustība Jūrmalas ielas izejā uz pludmali, lai varētu izbūvēt tur paredzētos inženiertīklus. Tuvākajā laikā tiks uzsākta Kūrmājas prospekta izejas pārbūve.

Kopš būvdarbu sākuma līdz maija beigām ir apstiprināti 8% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 29% no ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un elektroapgādes izbūves darbiem un 13% no teritorijas labiekārtojuma un segumu izbūves darbiem.

Lai mazinātu pieguļošās teritorijas kāpu un zaļās zonas izbradāšanu, iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi noteiktajiem kustību ierobežojumiem un iepļānot apkārtni pa pludmali vai caur Jūrmalas parku.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2021. gada 29. jūnijs

Turpinās pludmales izeju pārbūve – sāksies būvdarbi Jūrmalas ielas galā

Turpinot Liepājas pludmales infrastruktūras izbūvi, šonedēļ tiks sākti būvdarbi Jūrmalas ielas izejā uz pludmali. Saistībā ar būvdarbiem jārēķinās ar kustības ierobežojumiem pludmales izejā, kā arī uz gājēju un velosipēdistu ceļa.

Darbus paredzēts veikt mēneša laikā. Šajā laikā jārēķinās ar kustības ierobežojumiem, sākot no apgriešanās laukuma virzienā uz jūru, kā arī uz gājēju un velobraucēju ceļa, kas ved uzkalniņā gar rezerves stadionu. Gājējiem un velosipēdistiem jāņem vērā, ka, virzoties no Dienvidrietumu rajona, kustību varēs turpināt caur Jūrmalas parku.

Būvdarbi paredz Jūrmalas ielas pludmales izejā izbūvēt inženiertīklus, tostarp, ūdensvadu un kanalizāciju. Būvdarbus veiks SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošinās SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "JOE".



Būvdarbi objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" tiek īstenoti ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2021. gada 26. martā

Saskaņā ar veikto iepirkumu procedūru rezultātiem ir noslēgti visi ar būvniecības procesu saistītie līgumi. 2021.gada 28.janvārī ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "A-Land". 2021.gada 1.februārī ir noslēgts līgums ar SIA "d4m" par būvuzraudzības veikšanu objektā un 2021.gada 3.februārī noslēgts līgums ar SIA "JOE" par autoruzraudzības veikšanu.

Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, lai uzsāktu būvdarbus objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" un 2021.gada 22.martā būvlaukums ir nodots būvniekam SIA "A-Land" būvdarbu uzsākšanai.

Būvdarbi tiks veikti pakāpeniski, sākot ar pludmales izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!" puses, līdz ar to šis būs pirmais posms, kur būvdarbu veicējs veiks teritorijas iežogojumu, norobežojot daļu no gājēju un velosipēdistu ceļa. Lai mazinātu pieguļošās teritorijas kāpu un zaļās zonas izbradāšanu, iedzīvotāji tiek aicināti ņemt vērā kustības ierobežojumus un ieplānot apkārtceļu pa pludmali vai gar peldu iestādi jeb vannu māju.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2021. gada 22. martā

Sāksies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve; būs ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu ceļu

Lai pilnveidotu Liepājas pludmales infrastruktūru, padarot iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērtākas atpūtas iespējas, marta beigās sāksies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve. Saistībā ar būvdarbiem jārēķinās ar kustības ierobežojumiem Jūrmalas parkā un uz gājēju un velosipēdistu ceļa.

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju aiz Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!", kā arī izeju pie centrālās glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā tiks veikta inženiertīklu izbūve.

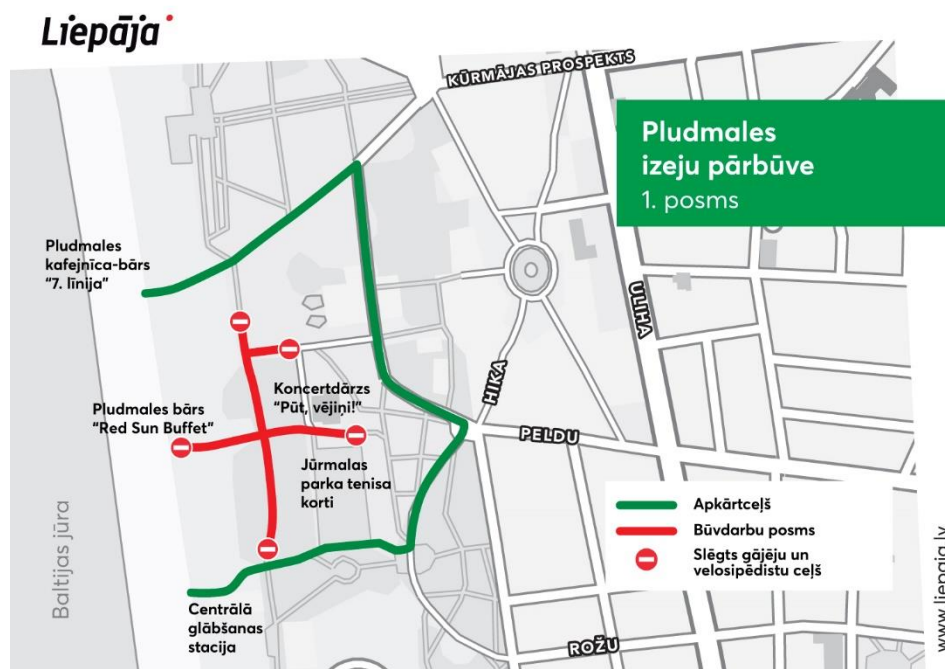

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju aiz Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!", kā arī izeju pie centrālās glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā tiks veikta inženiertīklu izbūve.

Darbi tiks veikti pakāpeniski, sākot ar pludmales izeju no koncertdārza "Pūt, vējiņi!" puses. Būvnieki marta beigās veiks teritorijas iežogojumu, norobežojot daļu no gājēju un velosipēdistu ceļa, kur notiks būvdarbi. Lai mazinātu kāpu un zaļās zonas izbradāšanu, aicinām iedzīvotājus ņemt vērā kustības ierobežojumus un iepļānot apkārtni gar peldu iestādi jeb vannu māju vai pa pludmali.

Liepājas centrālās pludmales izeju un apkārtējās teritorijas pārbūves un labiekārtošanas darbi paredz:

- gājēju takas pārbūvi ar cieto segumu līdz pludmales vārtiem un ar koka segumu pludmalē;
- stacionāro publisko tualetu, dušu un dzeramā ūdens punktu izveidi;
- velostativu, ģērbtuvju, SOS punktu, solu un atkritumu urnu izvietošanu;
- informācijas stendu un virziena norāžu izvietošanu;
- kāpu eroziju mazinošo risinājumu izbūvi un kāpu biotopa stāvokļa uzlabošanas pasākumus;
- papildu apstādījumu izveidi;
- vides objekta "Kaija" izveidi un uzstādīšanu;
- apgaismojuma pārbūvi.

Pēc projekta īstenošanas pludmales izejās tiks nodrošināta vides pieejamība, tostarp paredzot pandusa tipa uzbrauktuvi, lai visiem būtu ērta piekļūstamība pludmales aprīkojumam. Tostarp starp koncertdārzu "Pūt, vējiņi!" un tenisa kortiem esošajam gājēju ceļam tiks samazināts slīpums līdz 5%, kā arī gar pakāpieniem izbūvēts panduss.

Izbūvējot paredzēto infrastruktūru, tiks radīta ērta un sakārtota vide cilvēku atpūtai, kā arī no pārmērīgas cilvēku rīcības ietekmes tiks saudzēta un aizsargāta piejūras ainaviskā vērtība, t. sk., pelēkā kāpa.

Būvdarbus veiks SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošinās SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "JOE".

Būvdarbi objektā "Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā" tiks veikti ES fondu programmas "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" ietvaros.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022. gada 31. augustam.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,75 milj. eiro tai skaitā: Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 1,25 milj. eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 55 tūkstoši eiro, Liepājas pašvaldības finansējums – 165 tūkstoši eiro, neattiecināmie izdevumi – 283 tūkstoši eiro.

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Informācija ievietota 2020. gada 23. oktobrī

2020. gada 12. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi vienošanos Nr. 5.5.1.0/20/l/003 par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē" īstenošanu.

Iepirkumu komisija 2020. gada 19. augustā ir izsludinājusi būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus. Būvuzraudzības iepirkuma pretendentu piedāvājumi tika atvērti 16.septembrī un ir uzsākts saņemto piedāvājumu izvērtēšanas process. Savukārt, būvdarbu iepirkuma termiņš ir pagarināts līdz 4. novembrim, ņemot vērā potenciālo pretendentu uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes uz tiem, kas ietvēra arī nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā.
